

जय जन्मभूमि !



धुवाँउने ठाँटीको पुनर्निर्माण



प्रगति र आगामी कार्यक्रम

प्रस्तुति: धुवाँउने ठाँटी पुनर्निर्माण उपभोक्ता समिति
२०८२ माघ ९, श्रीपञ्चमी, काठमाडौं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- ▶ सोह्रौं शताब्दीमा निर्मित
- ▶ समय समयमा तत्कालीन पूर्वजहरूबाट पुनरुद्धार
- ▶ मूलबाटोको अतिथिशाला,
- ▶ हिउँदे व्यापार स्थल
- ▶ शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक जागरणको केन्द्र
(मूलतः विसं १९७९ देखि २००७ सालसम्मको अवधिमा भाषा पाठशाला १९७९, महाभारत पुराण २००४, ग्राम प्रशासन केन्द्र, नाटक घर, प्रभात पुस्तकालय, शिक्षा सदन पाठशाला, उपचारकेन्द्र आदिको सञ्चालन भएको)
- ▶ दुराडाँडाको साझा परिचय
- ▶ ऐतिहासिक सम्पदा।



Photo: Steve Inghram, 1971/72

साविक स्वरूप र अवस्था




- ▶ २१ फिट लामो १४ चौडा, फिट ढुङ्गे छानोयुक्त, एकतले
 - ▶ वि.सं.२०७२ को भूकम्पबाट चर्किएको
 - ▶ आँगनबाट मोटर बाटो खनेपछि थप जीर्ण
 - ▶ जुनसुकै समयमा ढल्नसक्ने अवस्थामा पुग्यो
 - ▶ भौतिक र मानवीय क्षतिको जोखिम बढ्यो
 - ▶ व्यक्तिगत कुराकानी र सामाजिक सञ्जालमा यसको पुनरुद्धारबारे चिन्ता र चासो प्रकट भए
 - ▶ राष्ट्रियस्तरका अखबारहरूमा लेख प्रकाशन भए
- (२०७५ चैत्र २७ मा समाचारपत्र, चैत्र २८ अन्तरङ्ग साप्ताहिक)
- ▶ जिर्णोद्धारको लागि ठोस कदम चालिहाल्नुपर्ने खाँचो महसुस भयो



पुनरुद्धारको प्रयास

कहिले	के गरियो
२०७९।७।१३	■ नवोदित कलेज काठमाडौँमा सरोकारवालाहरूको प्रारम्भीक भेला ■ नरनाथ अधिकारीसमेत करिब १२/१३ जना सहभागी ■ पुनरुद्धारबारे छलफल ■ पहल भएको र सहयोग सङ्कलन प्रारम्भ गर्नुभएको जानकारी।
२०७९।१०।२१	■ नवोदित कलेज काठमाडौँमा दोस्रो भेला ■ डा.ऋषिकान्त अधिकारीसमेतका करिब २० जना सहभागी ■ आफूबाट पनि पहल सुरु गरेको, ठाँटी भत्काउन पेशकीसमेत दिइसकेको र केही सहयोग पनि सङ्कलन भएको जानकारी ■ संस्थागतरूपमा र सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने निर्णय ■ डा.ऋषिकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय निर्माण समिति गठन ■ इ.महेन्द्रराज अधिकारीको संयोजकत्वमा इ.वरुणकान्त अधिकारी र इ.आशीष अधिकारी रहेको प्रविधिक समिति गठन,लागत अनुमान तयार गर्ने जिम्मेवारी ■ समितिबाट प्रारम्भीक ड्रइङ, डिजाइन र लागत अनुमान तयारी

कहिले	के गरियो
२०७९।११।१४	■ स्थानीयस्तरमा समन्वयका लागि विन्दुराज अधिकारीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय उपसमिति गठन ■ वडा अध्यक्ष अमृत न्यौपानेको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय स्थानीय सल्लाहकार समिति गठन ■ समितिका सदस्यबीच औपचारिक, अनौपचारिक छलफल, बैठक
२०७९ चैत	■ सुन्दरबजार नगरपालिकामा सम्पर्क राखी नगरप्रमुख समक्ष अनुरोध ■ प्रदेश अर्थमन्त्री टकराज गुरुङसँग पनि उहाँकै कार्यक्षमता भेट र अनुरोध ■ उहाहरूबाट पुरातत्व विभागमा सम्पर्क राख्न सुझाव ■ आफूहरूको हुनसक्ने सहयोगको आश्वासन ■ पुरातत्व विभागमा सम्पर्क


कहिले	के गरियो
२०७९।१२।३०	पुरातत्व विभागमा निवेदन (द.नं ३८७२)
२०८०।१।३।	नगरपालिकाको सिफारिस सहित पुरातत्व विभागमा निवेदन (द.नं ३९०२)
२०८०।३।६	सम्पदा सूचीमा सूचीकरणका लागि पुरातत्व विभागमा निवेदन (द.नं ५६२४)
२०८० मंसिरदेखि ०८१ पुष	- विभागमा निरन्तर सम्पर्क - बजेट नरहेको, आकस्मिक कोषबाट ५ लाख विनियोजन गर्नसकिने, त्यसपछि थप निकासा नहुने, बाँकी रकम उपभोक्ताबाट नै जुटाएर काम सम्पन्न गर्नुपर्ने जानकारी
२०८१।१।२८	- थप बजेट व्यवस्थापनका लागि तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीसँग पहल - सफलता प्राप्त भएन

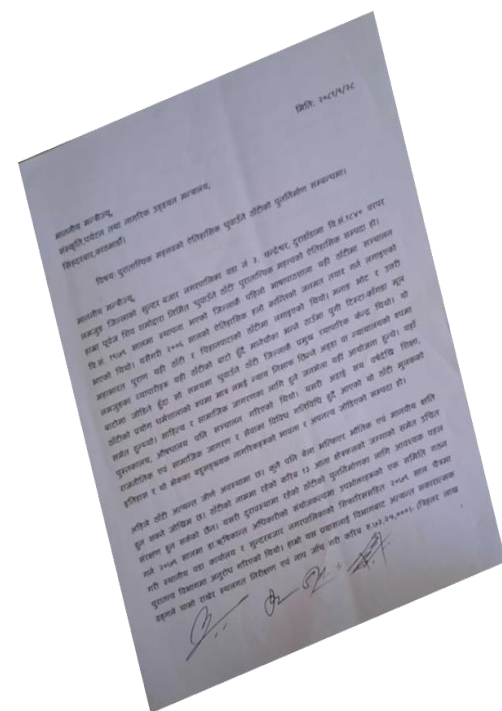

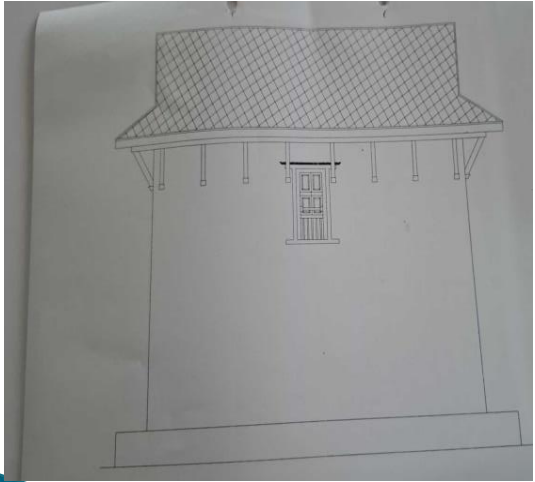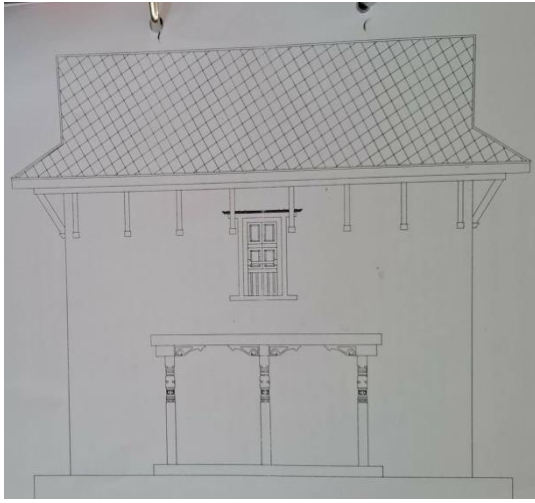


२०८१ फागुन र जेठ

- पुरातत्व विभागबाट विनियोजित बजेटबाट काम थाल्ने निर्णय
- विभागलाई जानकारी
- विभागबाट उपभोक्ता समिति गठन गरी आउन सूचित
- जेठ ८ मा विभागका प्राविधिकलाई स्थलगत अवलोकन गर्न लगियो
- लागत अनुमान, ड्रइङ डिजाइन तयारी
- चुना, सुर्की, सालको काठ प्रयोग गर्ने गरी ठेक्कापट्टाबाट काम गराउँदा करिब ७३ लाख लाग्ने अनुमान
- स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा करिब ३५ लाख लाग्ने अनुमान

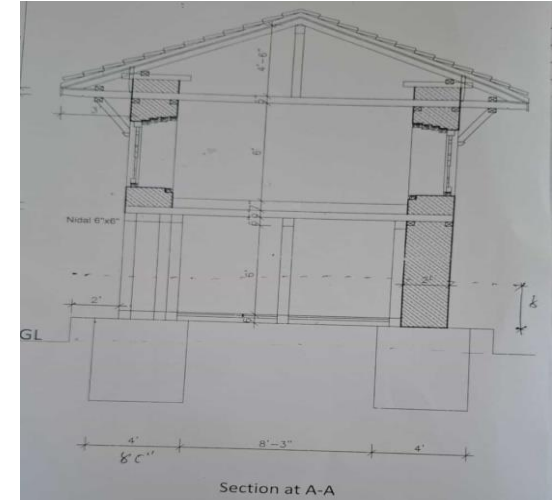

वडाबाट उपभोक्ता समिति गठन

०८१ फागुन	- वडा/नगरपालिकाबाट २ लाख बजेट विनियोजन - नरनाथ अधिकारीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन
०८१ फागुन ११	पुरातत्व विभागबाट विनियोजित बजेटबाट हुने कामका लागि वडा अध्यक्ष अमृत न्यौपानेको अध्यक्षतामा भएको आमभेलाबाट नरनाथ अधिकारीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन।
२०८२।१।२२	- धुवाँउने ठाँटी पुनर्निर्माण उपभोक्ता समिति नाममा वडा कार्यालयमा संस्था दर्ता - आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट PAN प्राप्त - ग्लोबल आइएमडि बैंक सुन्दरबजारमा खाता सञ्चालन
२०८१।२।१२	- पुरातत्व विभागको ५ लाख र उपभोक्ता समितिको योगदान १ लाख ३५ हजार गरी कुल ६ लाख ३५ हजार बराबरको कामको लागि विभागसँग संझौता. - सोही दिनबाट कार्य प्रारम्भ।

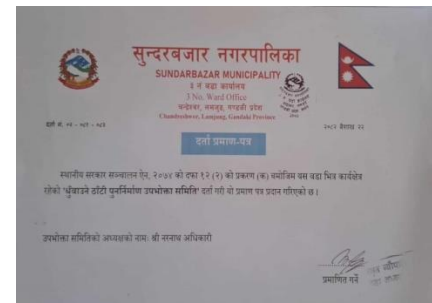

अनुगमन समिति र क्षेत्रीय संयोजक

अनुगमन समिति:

- संयोजक-विप्लव अधिकारी
- सदस्य सनत घिमिरे
- सदस्य सीता मजाकोटी

जिम्मेवारी- पुनर्निर्माण कार्यको समग्र अनुगमन

क्षेत्रीय संयोजक

चितवन- यादव घिमिरे

पोखरा- विपिन अधिकारी

क्षेत्रीय संयोजकहरूको भूमिका

- ठाँटीको पुनर्निर्माणको सिलसिलामा भइरहेका कामबारे आफ्नो क्षेत्रका सरोकारवाला शुभेच्छुकहरूलाई जानकारी गराउने
- आवश्यकतानुसार उहाँहरूको साथ, सहयोग प्राप्त गर्ने काममा समन्वय गर्ने

उपभोक्ता समितिको मिति २०८२/२/२० को निर्णयबाट

पुनर्निर्माण कार्यको शिलान्यास

- ▶ २०८२ जेठ २२ गते शिलान्यास
- ▶ अध्यक्षता: उपभोक्ता समिति अध्यक्ष नरनाथ अधिकारी
- ▶ प्रमुख अतिथि: नगरप्रमुख कृष्णप्रसाद कोइराला
- ▶ विशेष अतिथि: वडा अध्यक्ष अमृत न्यौपाने
- ▶ स्थानीय सामाजिक, राजनीतिक व्यक्तित्व, विद्यालय व्यसका अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक, सरोकारवाला उपभोक्ताहरूको उपस्थिति



कार्य प्रक्रिया



- ▶ वडा कार्यालयसँगको समन्वयमा वरको रुखको कटान छपान
- ▶ ठाँटी घर भत्काइ र ढुङ्गा काठपातको व्यवस्थापन
- ▶ जग खन्ने, ढुङ्गा सङ्कलन (४ ट्रिप) गर्ने र ढुङ्गा काटने / कुदने
- ▶ ठेलाको लागि चाहिने काठ व्यवस्थापन
- ▶ दक्ष जनशक्तिको खोजी र छलफल
- ▶ ढुङ्गा कुदने र लगाउने काममा अनुभवी गिरी बहादुर दुराको नेतृत्वमा जनशक्ति परिचालन
- ▶ कार्यसमिति र अनुगमन समितिको रेखदेख एवं वडा कार्यालयको प्राविधिक सहयोगमा अमानतबाट कार्य सम्पन्न

वर्षा याम, खेतिपातिको समय, दक्ष कामदारको अभाव, समय निकै कम भएकोले चुनौतीपूर्ण

पुनर्निर्माणमा भएको खर्च

१	वरको रुख कटान छपान	५०००	१३	छाप तयारी	४५०
२	ठाँटी घर भत्काउने ज्याला (जमिन तहसम्म)	१७०००	१४	ढलान प्लाष्टिक	१०००
३	जग खोतलेर ढुङ्गा पन्छाउने कामको ज्याला	६०००	१५	ढुङ्गा काटने मेसिन	३३५०
४	जग खन्ने, ढुङ्गा कुँदने काममा लगाइएका १८ जना ज्यामीको ज्याला	१९१००	१६	बिजुलीको तार	२६४०
५	ज्यामी ज्याला (महेश अधिकारी र विप्लव अधिकारी मार्फत लगाइएका ज्यामी)	१२०००	१७	सालको काठ खरिद	१८१००
६	ढुङ्गा (४ ट्रिप)	२४०००	१८	धागो र ग्यालिन	३८०
७	गिरी दुरासमेतका कर्मिहरूलाई भुक्तानी	४०००००	१९	चुन र कलर फोटो	४५०
८	दहतर बहतर शुल्क वापत वडामा दाखिला	१७२९०	२०	PAN नं लिन र खाता खोल्न भएको खर्च	१२१०
९	ज्यामीको खाजा (सुरुमा लगाइएका)	२९००	२१	पावर सकेट	३५०
१०	शिलान्यास समारोहको खर्च	१९३७	२२	अन्य फूटकर खर्च	३८३
११	बिजुली महसुल (अध्यक्ष जिम्मा छ)	६०००	जम्मा खर्च (नगद)		५,४१,४४०
१२	प्राविधिकका लागि भएको खर्च	१९००	बैंक मौज्दात		३०१०

खर्चको स्रोत

आम्दानी			खर्च		
१	पुरातत्व विभागबाट प्राप्त निकास (जम्मा मूल्याङ्कन ४६२०००।०० मध्ये धरौटी ५ प्रतिशत र TDS (Tax Deducted at Source) १ प्रतिशत कट्टा गरी निकास)	४३५०१०	१	कुल खर्च	५४१४४०
२	उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी सदस्यबाट भएको खर्च				
२.१	अध्यक्ष नरनाथ अधिकारी	२४३५०	२	बैंक मौज्दात	३०१०
२.२	सचिव चन्द्रमणि अधिकारी	७३६०			०
२.३	कोषाध्यक्ष देशबन्धु अधिकारी	३३४५०			०
२.४	सदस्य इ. महेन्द्रराज अधिकारी	२५३५०			०
२.५	सदस्य रुद्रनाथ अधिकारी	१५५८०			०
२.६	सदस्य रविकान्त अधिकारी	३३५०			०
३	पुष्पराज अधिकारीबाट सहयोग (दक्षिणा)	२००			०
	जम्मा	५४४४५०			५४४४५०

उपभोक्ताको योगदान (श्रम)तर्फको मूल्याङ्कन रु.१,१६,००० समेत कुल ५ लाख ५७ हजार बराबरको काम भएको।

भौतिक प्रगतिको अवस्था

- ▶ ४ फिट चौडाइ ३.५ फिट अग्लो जगको गारो लगाइएको
- ▶ जमिनको सतहबाट १.५ फिट उचाइ र २ फिट चौडाइ भएको पेटीको गारो लगाइएको
- ▶ २ फिट चौडाइ र ४ फिट उचाइसम्मको मुख्य गारो लगाइएको
- ▶ ६x६ इञ्च आकारको १३ फूट लम्बाइका जोर ठेला राखिएको (ठेला राखेको भाग १० फूट ६ इञ्च खुला छ)
- ▶ नपा /वडाबाट विनियोजित २ लाख बजेटबाट पूर्व, उत्तर र दक्षिणतर्फ टेवा पर्खाल लगाइएको ।



बाँकी काम र लागत अनुमान



मुख्य काम

- ▶ ठाँटी घरको गारो लगाउने काम (पुतली गारो बाहेक करिब ८ फिट)
- ▶ तलो छाप्ने र छाना छाउने (ढुङ्गाको छाना)
- ▶ काठको काम (साल र स्थानीय)
- ▶ आँगन सम्मयाउने र ढुङ्गा छाप्ने
- ▶ कम्पाउण्ड पर्खाल/पेटी लगाउने/गेट राख्ने
- ▶ चौतारोहरुको मर्मत र सौन्दर्यीकरण
- ▶ नागको थानको संरक्षण र वरपरको जमिनको सौन्दर्यीकरण

लागत अनुमान

- ▶ मूल भवनको बाँकी काम सम्पन्न गर्न ३० लाख ९० हजार ७०० लागत अनुमान भएको (पुरातत्व विभागबाट)
- ▶ मूल भवन बाहेक माथि उल्लिखित अरु कामका लागि करिब १२ लाख खर्च हुने अनुमान रहेको।

बाँकी काम सम्पन्न गर्न भइरहेका काम

- ▶ अघिल्लो आवमा काम गरेका गिरी बहादुर दुरासँग ठाँटी घरको बाँकी काम (काठ, छाना छाउने ढुङ्गा र छाउने मिस्त्रीको ज्याला बाहेक) का लागि लागत अनुमान माग गरिएको (काम गर्ने दक्षता र अनुभवका हिसावले अरु विकल्प नभएको)
- ▶ निजले समिति समक्ष १६ लाख ११ हजारको अनुमान पेश गरेको
- ▶ मंसिर ३ गते समितिका पदाधिकारी र उपलब्ध सदस्यको रोहबरमा छलफल हुँदा उक्त काम १४ लाखमा सम्पन्न गर्न दुवै पक्ष सहमत भई समझदारी गरिएको
- ▶ यसमध्ये १ लाख रुपैयाँ मंसिर १५ सम्ममा, तला छापेपछि ५ लाख र बाँकी काम सम्पन्न भएपछि दिने समझदारी गरिएको
- ▶ यस अनुरूप काम सुरु भएको, सालको काठ र चाँपको काठ खरिद गरिएको । नारायणप्रसाद अधिकारीबाट सहयोग स्वरूप प्राप्त भएको

- ▶ चिलाउनेको रुख विभिन्न दाताहरू (डा पूर्णकान्त, डा.ऋषिकान्त, अरुणकान्त अधिकारी, देवीप्रसाद न्यौपाने) बाट सहयोगस्वरूप प्राप्त
- ▶ काठको बन्दोवस्तमा पूर्णभद्र न्यौपाने, हरिकृष्ण न्यौपाने, बाबुराम न्यौपाने, नारायण प्रसाद अधिकारी, तोयनाथ अधिकारीसमेतबाट सहजीकरण भएको
- ▶ सहयोगस्वरूप प्राप्त काठको परिमाण र मूल्य एकीन गरी अभिलेख राखिने
- ▶ एक लाख रुपैयाँ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र सदस्यहरू महेन्द्र अधिकारी, रुद्रनाथ अधिकारी र रविकान्त अधिकारीबाट जुटाइ पठाएको
- ▶ सामाजिक विकास कार्यालयबाट विनियोजित ५ लाखको कामका लागि सम्झौता भएको।

यो काममा सुमन अधिकारीबाट सहजीकरण भएको |

स्रोत व्यवस्थापनको अवस्था

(क) सृजना भएको दायित्व	
गिरी बहादुर दुरालाई दिनुपर्ने	१४,००,०००।००
सालको र चाँपको काठ खरिद	४५,०००।००
छाउने ढुङ्गा र मिस्त्री ज्याला	२,००,०००।००
लिपपोत, भुइतलामा ढुङ्गा छाप्ने काम	१,००,०००।००
गत वर्षको नपुग	१,०९,०००।००
आँगन, कम्पाउण्डवाल, चौतारो, नागको थानको मर्मत र सौन्दर्यीकरण	१२,००,०००।००
जम्मा	३०,५४,०००।००
समाजिक विकास कार्यालय लमजुङबाट प्राप्त हुने (धरौटी, TDS कट्टागरी)	४,५५,०००।००
नपुग हुने (करिब)	२५,९९,०००।००
विभिन्न व्यक्तिहरूबाट डा. ऋषिकान्त अधिकारी मार्फत ठाँटीको लागि सङ्कलन भएको सहयोग	प्राप्त हुन बाँकी
मूल भवनमा छानो राख्ने कामका लागि मात्रै पनि नपुग हुने स्रोत करिब	१४,००,०००।००

स्रोत व्यवस्थापनको उपाय

- ▶ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट

(आवश्यक पहल गरिने)

- ▶ देश, विदेशमा रहेका ठाँटीसँग अपनत्व जोडिएका दाताहरूबाट प्राप्त हुने सहयोग

(सम्भावित दाताहरू सूची तयार गरी अनुरोध गरिने) विषय सहयोगका लागि



आफ्नै कुरा

संस्थागत व्यवस्था

(क) कार्यसमिति (२०८१ फागुन ११ मा वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा भएको भेलाबाट गठन)

अध्यक्ष	नरनाथ अधिकारी
उपाध्यक्ष	देविका अधिकारी
सचिव	चन्द्रमणि अधिकारी
कोषाध्यक्ष	देशबन्धु अधिकारी
सहसचिव	सरस्वती अधिकारी
सदस्य	इ.महेन्द्रराज अधिकारी, वशिष्ठ घिमिरे, रुद्रनाथ अधिकारी, कमला पौडेल, हरिमाया अधिकारी, विन्दुराज अधिकारी, रविकान्त अधिकारी, प्रविना नेपाली, विकास ढकाल, महेश अधिकारी ।

(ख) अनुगमन समिति (०८२।२।२० मा गठन)

संयोजक	विप्लवप्रसाद अधिकारी
सदस्य	सनत घिमिरे
सदस्य	सीता मजाकोटी

क्षेत्रीय/वैदेशिक संयोजन

संयोजक चितवन र पोखरा
यादव घिमिरे (चितवन)
विपिन अधिकारी (पोखरा)
संयोजक र सदस्य अमेरिका
विकल अधिकारी, संयोजक
उपेन्द्र न्यौपाने, सदस्य
कमलबाबु अधिकारी, सदस्य
संयोजक र सदस्य क्यानडा
रविकिरण अधिकारी, संयोजक
चन्द्रिका अधिकारी, सदस्य
संयोजन युरोप
प्रकाश अधिकारी

सम्पर्क व्यक्ति

- ▶ दाता दाजुभाइ दिदी बहिनीसँग सम्पर्क, समन्वयका लागि कार्य समितिका देहायका सदस्यहरूलाई सम्पर्क व्यक्ति (Focal Person) तोकिएको,

क्रम	नाम	ह्वाट्स एप नम्बर
१	इ. महेन्द्रराज अधिकारी	+977 985-1166220
२	रुद्रनाथ अधिकारी	+977 985-1163635
३	रविकान्त अधिकारी	+977 9861817616

२०७९।१०। २१ मा गठन गरिएको निर्माण समिति र प्राविधिक समिति

(क) निर्माण समिति

संयोजक	डा.ऋषिकान्त अधिकारी,
उपसंयोजक	नरनाथ अधिकारी
सचिव	चन्द्रमणि अधिकारी
कोषाध्यक्ष	देशबन्धु अधिकारी
सदस्य	गायत्री अधिकारी, देवीका अधिकारी, इ.महेन्द्र राज अधिकारी,
रुद्रनाथ	अधिकारी, विन्दुराज अधिकारी, रविकान्त अधिकारी, सुमन
अधिकारी	(टारी)

(ख) प्राविधिक समिति

इ.महेन्द्र राज अधिकारी, संयोजक
इ.वरुणकान्त अधिकारी, सदस्य
इ.आशीष अधिकारी, सदस्य

२०७९।११।१४ मा गठीत उपसमिति र स्थानीय सल्लाहकार समिति

(क) उपसमिति

संयोजक	विन्दुराज अधिकारी
उपसंयोजक	विप्लवप्रसाद अधिकारी
सदस्य	वशिष्ठ घिमिरे, रोहिणी घिमिरे, बुद्धिमान मजाकोटी, रामचन्द्र
अधिकारी,	विकास ढकाल, उदगम अधिकारी, महेश अधिकारी

(ख) स्थानीय सल्लाहकार समिति

संयोजक	वडा अध्यक्ष अमृत न्यौपाने
सदस्य	सोमनाथ अधिकारी,
सदस्य	अरुणकान्त अधिकारी,
सदस्य	विष्णु अधिकारी,
सदस्य	हिरण्य अधिकारी,
सदस्य	वामदेव अधिकारी,
सदस्य	सरला अधिकारी

संस्थाको लेखापरीक्षण र साधारण सभा

- ▶ संस्थाको लेखा परीक्षण सम्पन्न भएको
- ▶ कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरिएको
- ▶ २०८२।८।३ मा धुवाउने ठाँटीमा वडा अध्यक्षको विशेष उपस्थितिमा आमभेला/ प्रथम साधारण सभा सम्पन्न
- ▶ विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध स्थानीय नेतृत्वसमेत ४६ जनाको उपस्थिति
- ▶ सभामा प्रगति प्रतिवेदन र आम्दानी खर्चको विवरण प्रस्तुत, चालु आ.व. को कार्यक्रमबारे जानकारी
- ▶ संस्थाबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनहरू सर्वसम्मतरूपमा पारित
- ▶ चालु वर्षको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पनि मौजुदा उपभोक्ता समिति र अनुगमन समितिलाई नै निरन्तरताको निर्णय



दाताबाट प्राप्त सहयोग तथा प्रतिबद्धता(२०८२ माघ ९ गतेसम्ममा)

- | | |
|--|----------------|
| ▶ गायत्री अधिकारी,स्वाँरा | रु.१,०१,००८।०० |
| ▶ प्रकाश अधिकारी, उपल्ला गाउँ हाल बेलायत | रु.१,००,०००।०० |
| ▶ कमलबाबु अधिकारी,चारघरे हाल अमेरिका | रु.१,११,१११।०० |
| ▶ चन्द्रकान्त अधिकारी, स्वाँरा | रु. ७५,०००।०० |
| ▶ गेहेन्द्रनाथ अधिकारी, स्वाँरा | रु.१,०१,१११।०० |
| ▶ नरनाथ अधिकारी, स्वाँरा | रु.१,०१,१११।०० |
| ▶ कल्याण अधिकारी र आमाहरु,स्वाँरा | रु.१,००,०००।०० |
| ▶ लक्ष्मीप्रसाद अधिकारी, छहरेपानी | रु. २५,०००।०० |
- ▶ काम सम्पन्न भए पछि सबैको सल्लाह तथा सुझावमा निर्माण सम्पन्नपश्चात् शिलालेख/स्मारिकामा दाताको सहयोगको अभिलेख राखिने छ।

उदारमना दाता महानुभावहरुप्रति हामी हार्दिक धन्यवाद,आभार प्रकट गर्दछौं।

दीर्घकालिन सोच (प्रस्ताव)

- ▶ धुवाँउने ठाँटीको उपयोग र रेखदेखका लागि स्थायी संयन्त्र निर्माण
- ▶ हलो क्रान्तिको पूर्वतयारीको सिलसिलामा महाभारत पुराण लगाइएका २ वटा ठाँटी मध्येको चिहानपाटाको गङ्गा चौतारो अगाडिको ठाँटीको पहिचान र परिचय स्थापित एवं गङ्गा चौतारी को संरक्षण, गङ्गापथको मर्मत सम्भार
- ▶ गङ्गा चौतारीदेखि धुवाउने ठाँटीसम्मको बाटो (गङ्गा पथ) स्तरोन्नतिको पहल
- ▶ चिहानपाटाका विजय चौतारी, न्यौपाने चौतारी आदिको पुनर्स्थापना
- ▶ चन्द्रेश्वर बाबाबाट स्थापित चन्द्रेश्वर महादेव मन्दिरको संरक्षण र पुनर्निर्माण
- ▶ दुराडाँडाका विभिन्न सम्पदाहरूको संरक्षणको पहल।

गङ्गा चौतारो र गङ्गा पथ

लक्ष्मीदेवी पौडेल (मु.हरिभक्त पौडेलकी बुहारी) का अनुसार सर्वोदय स्कुलको पश्चिमपट्टि छेउमा रहेको चौतारो नै गङ्गा चौतारो हो। सोही चौतारोको अगाडि अहिले खजेदुराको सालिक भएको ठाउँको ठीक तल एक ठाँटी/ पाटी थियो। यो पाटीमा २००३ सालको हरिशयनी एकादशीदेखि २००४ सालको हरिशयनी एकादशीका अघिल्लो दिनसम्म महाभारत पुराण लगाइएको थियो। २००४ सालको हरिशयनी एकादशीदेखि धुवाँउने ठाँटीमा पुराण भनियो। पुराणवाचन नित्य हुने गर्थ्यो। यो पाटीमा कहिले काहीँ पढाइ पनि हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ चौतारोमै पनि पुराण भनिन्थ्यो।

गङ्गा चौतारो गिरेचौरका स्वर्गीय गङ्गाधर पौडेलको स्मृतिमा उनकी पत्नी वेदमायाले आफ्ना भाइबन्धुको सहयोगमा बनाएकी हुन्। चौतारो बनाएपछि चिहानपाटादेखि धुवाँउने ठाँटीसम्मको बाटो मर्मत गरी सिंढीसमेत लगाइयो। यो बाटोलाई गङ्गापथ नामकरण गरियो। अहिले पाटीको अस्तित्व मेटिइसक्यो। चौतारो पनि संरक्षणको पर्खाइमा छ।

अमृतमणि पौडेलको सहयोगमा सङ्कलित विवरण

कार्य समितिका पदाधिकारी र सदस्यबाट हालसम्म भएको खर्च

१	अध्यक्ष	नरनाथ अधिकारी	रु.५४,८५०
२	सचिव	चन्द्रमणि अधिकारी	रु.१७,३६०
३	कोषाध्यक्ष	देशबन्धु अधिकारी	रु.४१,४५०
४	सदस्य	महेन्द्रराज अधिकारी	रु.४०,३५०
५	सदस्य	रुद्रनाथ अधिकारी	रु.४०,५८०
६	सदस्य	रविकान्त अधिकारी	रु.१८,३५०
जम्मा			रु.२,१२,९४०

हाम्रो प्रतिबद्धता

ठाँटीको कामका लागि पटक पटक पुरातत्व विभाग लगायतका विभिन्न निकाय र दुराडाँडा (पाँच पटक), वेसीसहर (दुई पटक) आउजाउ गर्दाको सम्पूर्ण खर्च (यातायात भाडा, खाजा, खाना र होटेल बासमा भएको खर्च) सम्बन्धित पदाधिकारी /सदस्यले निजी रूपमा व्यहोर्दै आइएको छ। अगामी दिनमा पनि ठाँटीका लागि सरकारी निकाय वा दाताहरूबाट जुटने सहयोगको रकमबाट एक पैसा पनि हाम्रो निजी प्रयोजनमा खर्च नगर्ने, सरोकारवालाको जानकारीका लागि आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौं।

धुवाउने ठाँटी पुनर्निर्माण उपभोक्ता समिति



विशेष धन्यवाद

- ▶ पुरातत्व विभाग (उपसचिव रामबहादुर कार्की, प्राविधिक कर्मचारी सुषमा पौठक, इ.गोविन्द अधिकारी, नासु नारायण तिवारी)
- ▶ नवराज ढकाल, सचिव सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश
- ▶ नगरप्रमुख कृष्णप्रसाद कोइराला, सुन्दरबजार नपा
- ▶ सुमन अधिकारी, टारी (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, बेसीसहर नपा)
- ▶ कार्यालय प्रमुख मिता थापासमत्का कर्मचारी, सामाजिक विकास कार्यालय लमजुङ
- ▶ वडा अध्यक्ष अमृत न्यौपाने, निर्मला ढकाल वडा सदस्य सुनपा-३,
- ▶ स्थानीय राजनीतिक एवं सामाजिक व्यक्तित्वहरु
- ▶ अनुगमन समिति संयोजक विप्लव अधिकारी र सदस्यहरु
- ▶ इ.कपील अधिकारी, सुनपा वडा नं ३
- ▶ सुरभी एगो फार्म, विद्याकान्त अधिकारी
- ▶ नाइके गिरी बहादुर दुरा
- ▶ यज्ञश्वर अधिकारी नवराज घिमिरे जिता, पूर्णभद्र न्यौपाने, हरिकृष्ण न्यौपाने, बाबुराम न्यौपाने, नारायणप्रसाद अधिकारी. तोयनाथ अधिकारी,
- ▶ चिलाउनेको रुखका दाता र अन्य दाता
- ▶ पूर्वसमितिका पदाधिकारी सदस्य, सल्लाहकार, उपसमिति सदस्यहरु
- ▶ लेखापरीक्षक डोलप्रसाद दाहाल, ओखलढुङ्गा
- ▶ उद्गम अधिकारी
- ▶ पूर्णचन्द्र अधिकारी, किर्तीचन्द्र अधिकारी
- ▶ कार्यसमितिमा रहनुभएका स्थानीय सदस्य, विशेषतः महेश अधिकारी, विन्दुराज अधिकारी, विकास ढकाल तथा अन्य ठाँटी वरपरका छिमेकीहरु
